



# Italienska villan, Ronneby brunn


Byggnadsminne nr 72  
Slutrapport, antikvarisk kontroll  
Exteriör renovering



Rapport, år och nr: 2006:28  
Rapportnamn: Italienska villan, Ronneby Brunn  
Byggnadsminne nr 72. Slutrapport, antikvarisk kontroll  
Exteriör renovering  
Diarienummer: 434-524-06  
Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona.  
Webbplats: [www.k.lst.se](http://www.k.lst.se)  
Författare/Kontaktperson: Anna-Karin Skiöld  
ISSN: 1651-8527  
Omslagsfoto: Anna-Karin Skiöld



**ITALIENSKA VILLAN I RONNEBY BRUNN, FASTIGHETEN KARLSTORP  
2:1, RONNEBY KOMMUN**

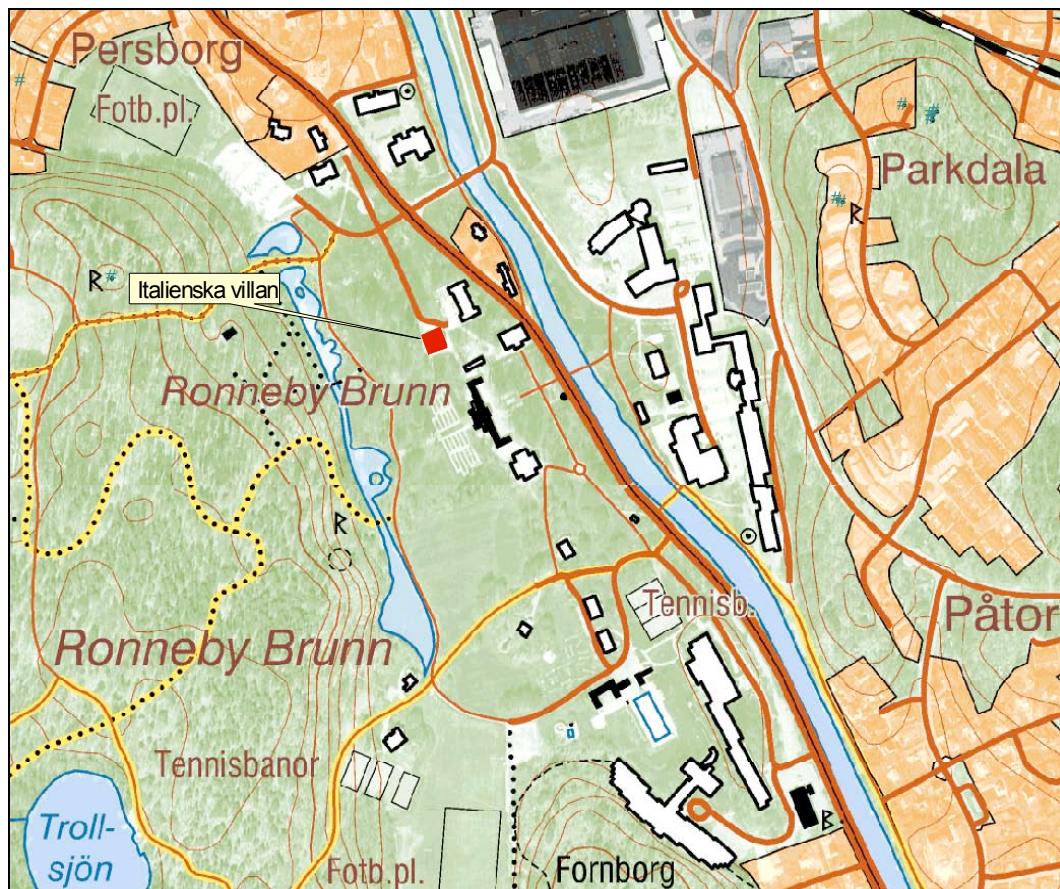



2006-12-18

### Parter

Beställare: Ronneby kommun

Entreprenör: Ronneby Måleri AB

Länsstyrelsens representant: Bebyggelseantikvarie Anette Johansson

Antikvarisk kontrollant: Bebyggelseantikvarie Anna-Karin Skiöld

### Objektbeskrivning

Kurortsverksamheten i Ronneby inleddes 1706 men utvecklades främst under 1800- och 1900-talen. Parkens trävillor, varav Italienska villan är en, uppfördes runt sekelskiftet 1900. Parken, inklusive 17 byggnader, förklarades som byggnadsminne 1996. År 2003 blev området, inklusive Brunnskogen, länets första kulturresevat.

### Beslut

Bidragsbeslutet omfattar en exteriör renovering av fasad med målning och reparation av skador samt översyn av yttertaket. Länsstyrelsen beslutade att lämna ett bidrag på högst 510 000 kronor (dnr. 434-524-06), vilket skulle utgöra 46 % av de antikvariska överkostnaderna som beräknats till 1 100 000 kronor. Eftersom målningsarbetena inte godkändes så minskades bidraget och den summa som utbetalades blev 322 414 kronor.

### Åtgärderna i sammanfattning

Renoveringen har omfattat borttagande av färgskikt, målning av fasaden samt vissa trälagningar. Fasaden målades senast om någon gång på 80-talet. Efter skrapning och framtagande av äldre färgskikt har en färgsättning gjorts enligt följande:

Fasaden: obränd terra 4A-5873

Knutbräder, foder, detaljer: brun mörkocker 2C-4031

Fönsterbågar etc.: engelskt rött 1A-10A

Källardörr och källarfönster: guldocker 7C-94

### Möten och kontroller

#### 2006-08-16

Startmöte på plats med Ronneby kommun, Ronneby Måleri AB och länsstyrelsen.

Det fastställdes att huset inte är målat med någon akrylatfärg som många andra av villorna i brunsparken, utan en alkydolja. Färgen ska skrapas ner till fast färgskikt eller trärent. De trärena ytorna ska oljas med linolja och sedan ska hela fasaden målas med linoljefärg (Engwall Claesson). Länsstyrelsen ska inom två veckor ha bestämt vilka kulörer som ska användas på fasaden.

Taket har renoverats. En plywoodskiva har lagts och ny takpapp på det.

Arbetena beräknas påbörja vecka 34.



2006-12-18

**2006-08-21**

Besök på plats. Genom att skrapa fram en färgtrappa bestämdes kulörerna till fasaden. Fasaden: guldocker 3A-94  
Knutbräder, foder, detaljer: brun mörkocker 2C-4031  
Fönsterbågar etc.: engelskt rött 1A-10A  
Källardörr och källarfönster: guldocker 7C-94  
Grunden ska målas med en kalkfärg och enligt kalkfärgsprovssamlingen Kalkfärg 90 kulör 98:11  
En provyta ska målas och kontrolleras innan kulörerna slutgiltigt bestäms.

**2006-08-30**

Kulörerna hade målats upp på provytor. Samtliga kulörer utom fasadfärgen guldocker 3A-94 godkändes. En ny fasadkulör togs fram, obränd terra 4A-5873.

**2006-09-11**

Den nya kulören obränd terra 4A-5873 hade målats upp på en provyta. Kulören godkändes.

**2006-09-20**

Besök på plats. Fasaden hade börjat målas.

Vid snickeriarbetena har trådspik använts. Antikvarisk kontrollant meddelade Johnny Kullberg att det bara är klippspik som får användas, eftersom det är det som använts på huset tidigare.

**2006-10-02**

Kontroll

**2006-10-30**

Kontroll

Eftersom grunden var målad med en silikatfärg så beslutades att använda samma typ av färg vid ommålningen. Kulör 98:11 enligt kalkfärgsprovssamlingen ska ersättas av kulörbestämning enligt NCS-index.

**2006-11-20 Slutbesiktning**

Arbetet är slutbesiktat av Länsstyrelsen. Målningsarbetena godkändes inte eftersom spår efter sliprondellerna syns tydligt på fasaden. Under arbetets gång har antikvarisk kontrollant påpekat att färgen helst inte ska avlägsnas med hjälp av sliprondell p.g.a. att det lätt blir märken. Om målarna ändå valde att använda sig av en rondellslip påpekades det att de skulle vara noga med att slipa bort spåren efter denna.

Det är kladdigt målat i övergångar mellan de olika kulörerna.

All målning var heller inte slutförd, bland annat dörren och fönstret i källarplan var omålade. Fönsterkarmarna var inte målade överallt och tätninglistor vid fönstren saknades.



LÄNSSTYRELSEN  
BLEKINGE LÄN

Antikvarisk slutrapport

2006-12-18

4 (11)

Dnr. 434-524-06

Anna-Karin Skiöld, bebyggelseantikvarie  
Antikvarisk kontrollant

**Sändlista**

Johnny Kullberg, Ronneby kommun  
Blekinge Museum  
Riksantikvarieämbetet  
Antikvarisk-topografiska arkivet  
Centraldiariet  
Akten



LÄNSSTYRELSEN  
BLEKINGE LÄN

Antikvarisk slutrapport

5 (11)

Dnr. 434-524-06

2006-12-18

## FOTOBILAGA



060816 Utseende innan renovering



060816



060816



LÄNSSTYRELSEN  
BLEKINGE LÄN

Antikvarisk slutrapport


6 (11)

Dnr. 434-524-06

2006-12-18



060816

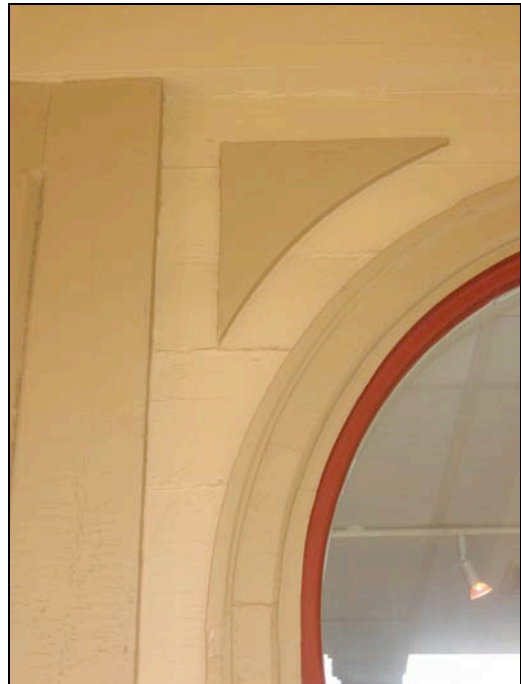

060816



060816 Fris utmed taket.





LÄNSSTYRELSEN  
BLEKINGE LÄN

Antikvarisk slutrapport

7 (11)

Dnr. 434-524-06

2006-12-18



060821 Utseende innan renovering



060821



LÄNSSTYRELSEN  
BLEKINGE LÄN

Antikvarisk slutrapport

8 (11)

Dnr. 434-524-06

2006-12-18



060830, Snickeriarbeten



060830



060911



LÄNSSTYRELSEN  
BLEKINGE LÄN

Antikvarisk slutrapport

2006-12-18

9 (11)

Dnr. 434-524-06



060911. Provstrykning av kulörer



060920 Målning av fasaden har börjat



LÄNSSTYRELSEN  
BLEKINGE LÄN

Antikvarisk slutrapport

10 (11)

Dnr. 434-524-06

2006-12-18



061002



061030



Slutbesiktning 061120



Slutbesiktning 061120. Målningen godkändes inte eftersom det inte var färdigt, kladdigt målat i övergångar samt att rondellspår från slipen var synliga i panelen.



Slutbesiktning 061120
